

1 Task 1: Xây dựng Product Backlog

Dưới đây là danh sách các hạng mục công việc (User Stories) cho toàn bộ dự án, được sắp xếp theo độ ưu tiên.

ID	Role	Feature (Tính năng)	Benefit (Lợi ích)	Priority
US01	Customer	Đăng ký và đăng nhập	Để tôi có thể truy cập vào tài khoản cá nhân và bắt đầu mua sắm.	High
US02	Admin	Thêm mới sản phẩm	Để tôi có thể cập nhật hàng hóa lên hệ thống cho khách mua.	High
US03	Customer	Xem danh sách sản phẩm	Để tôi có thể biết cửa hàng đang bán những gì và chọn lựa.	High
US04	Customer	Thêm vào giỏ hàng	Để tôi có thể gom các món đồ muốn mua lại trước khi thanh toán.	High
US05	Staff	Xem danh sách đơn hàng	Để tôi có thể biết cần đóng gói và giao những đơn hàng nào.	Medium
US06	Customer	Tìm kiếm sản phẩm	Để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy món đồ mình cần mà không phải lướt quá nhiều.	Medium
US07	Admin	Xem báo cáo doanh thu	Để tôi biết tình hình kinh doanh của cửa hàng trong tháng.	Low

2 Task 2: Sprint Planning (Sprint 1)

Thời gian Sprint: 1 tuần (5 ngày làm việc).

2.1 Sprint Goal

"Xây dựng nền tảng cốt lõi cho hệ thống: Xác thực người dùng và Quản lý danh mục sản phẩm cơ bản."

2.2 Chọn User Stories cho Sprint 1

Dựa trên mức độ ưu tiên và sự phụ thuộc, nhóm đã chọn 3 User Stories sau:

1. **US01:** Đăng ký và đăng nhập.
2. **US02:** Thêm mới sản phẩm (Admin).
3. **US03:** Xem danh sách sản phẩm (Customer).

2.3 Sprint Backlog (Phân rã User Stories thành Tasks)

User Story	Task Kỹ thuật	Estimate (h)
US01: Auth	1. Thiết kế Database bảng Users (ERD & SQL).	2h
	2. Viết API Backend: Đăng ký (Register) & mã hóa mật khẩu.	3h
	3. Viết API Backend: Đăng nhập (Login) & tạo JWT Token.	3h
	4. Thiết kế giao diện (Frontend) trang Login/Register.	4h
	5. Tích hợp API vào giao diện Login.	2h
US02: Admin	6. Thiết kế Database bảng Products .	1h
	7. Viết API Backend: CRUD sản phẩm (Create, Read, Update, Delete).	4h
	8. Xây dựng giao diện trang Admin Dashboard để nhập liệu.	4h
US03: View	9. Viết API Backend: Lấy danh sách sản phẩm (Get All).	1h
	10. Thiết kế giao diện trang chủ hiển thị lưới sản phẩm.	3h
	11. Tích hợp API hiển thị dữ liệu lên trang chủ.	2h
Tổng cộng: 11 Tasks		≈ 29 giờ

3 Task 3: Mô phỏng Daily Scrum

Ngữ cảnh: Buổi sáng ngày thứ 3 của Sprint.

1. Hôm qua tôi đã làm gì?

- Tôi đã hoàn thành thiết kế Database cho bảng **Users** và **Products**.
- Tôi đã viết xong API Backend cho chức năng Đăng ký và Đăng nhập (Task 1, 2, 3 đã xong).

2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ tập trung làm Frontend cho trang Đăng nhập/Đăng ký để ghép nối với API (Task 4, 5).
- Nếu còn thời gian, tôi sẽ bắt đầu viết API CRUD cho Sản phẩm (Task 7).

3. Tôi gặp trở ngại gì?

- Tôi đang gặp chút khó khăn trong việc cấu hình CORS khi gọi API từ Frontend (ReactJS) sang Backend, khiến trình duyệt báo lỗi bảo mật. Tôi cần dành khoảng 1 tiếng sáng nay để debug việc này.


4 Task 4: Theo dõi tiến độ Sprint (Burndown Chart)

Giả định: Tổng số lượng Task là 11 tasks.

Bảng dữ liệu theo dõi

Ngày	Lý tưởng	Thực tế	Ghi chú
Day 1	11	11	Bắt đầu Sprint
Day 2	8.8	9	Hoàn thành thiết kế DB
Day 3	6.6	7	Xong phần Auth Backend
Day 4	4.4	4	Xong Frontend Auth & API Product
Day 5	2.2	1	Xong Frontend Admin, còn chút lỗi UI
End	0	0	Hoàn thành toàn bộ

Biểu đồ Burndown

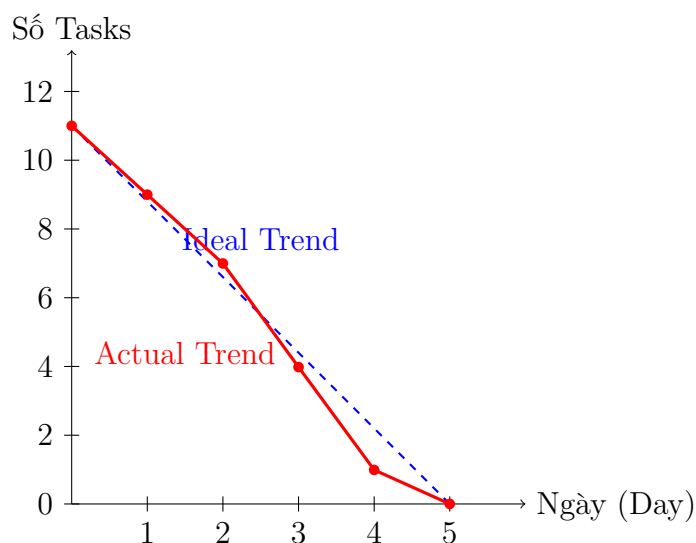

5 Task 5: Sprint Review & Retrospective

5.1 Sprint Review (Tổng kết sản phẩm)

- Các chức năng đã hoàn thành (Done):

Hệ thống đăng ký, đăng nhập hoạt động tốt, có bảo mật mật khẩu.

Admin đã có thể thêm sản phẩm vào cơ sở dữ liệu.

Trang chủ đã hiển thị được danh sách sản phẩm vừa thêm.

- **Đánh giá Sprint Goal:** Đạt được 100%. Nền tảng hệ thống đã sẵn sàng để phát triển các tính năng đặt hàng ở Sprint sau.

5.2 Sprint Retrospective (Cải tiến quy trình)

- Điều gì làm tốt?

- Việc thiết kế Database kỹ ngay từ đầu (Task 1 & 6) giúp việc viết API sau đó rất nhanh.
- Tuân thủ đúng độ ưu tiên, không bị lan man sang các chức năng chưa cần thiết.

- **Điều gì chưa tốt?**

- Tốn quá nhiều thời gian để sửa lỗi CSS căn chỉnh giao diện (Frontend).
- Gặp lỗi CORS mất thời gian xử lý do chưa cấu hình server ngay từ đầu.

- **1 Cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo:**

- Sử dụng thư viện giao diện có sẵn (như Bootstrap hoặc Ant Design) thay vì tự viết CSS thủ công để tiết kiệm thời gian.
